STIVEN CATALYST

SERIA E DYTË · TETOR 2026

# MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.




STRATEGJIA

## PSE PROJEKTET VONOHEN DHE DALIN NGA BUXHETI

Një libër i planifikuar për dy vjet që zgjati tetë, sa pak projekte e mbajnë buxhetin dhe afatin, pamja nga brenda dhe nga jashtë, gabim apo shtrembërim, përballë cilës shifër matet, dhe një kartë për një vlerësim.

**8,5%**

e më shumë se 16.000 projekteve mbaruan brenda buxhetit dhe afatit; 0,5% dhanë edhe përfitimet e premtuara.

FLYVBJERG & GARDNER, 2023

BRENDA

TEMA KRYESORE
**Dy vjet që u bënë tetë**
FAQE 03

SHIFRAT
**Brenda buxhetit dhe afatit: 8,5%**
FAQE 04

MJETI I NUMRIT
**Karta e pamjes nga jashtë**
FAQE 08

NR. 74 · STRATEGJIA

# Në këtë numër

Shumica e projekteve miratohen me një vlerësim që e bëjnë ata që duan t'i realizojnë. Vlerësimi ndërtohet nga plani, hap pas hapi, dhe rrallë pyet si dolën projektet e ngjashme. Këtu flitet pikërisht për atë pyetje dhe për shifrën që ajo jep.

Ekipi i Daniel Kahneman-it priste ta mbaronte një libër shkollor për rreth dy vjet dhe e mbaroi për tetë. Në bazën e të dhënave të Bent Flyvbjerg-ut me më shumë se 16.000 projekte, 8,5% mbaruan brenda buxhetit dhe afatit. Dan Lovallo dhe Kahneman-i fajësuan pamjen nga brenda, të ndërtuar vetëm nga plani; Flyvbjerg-u shtoi nënvlerësimin e qëllimshëm. Të dyja shpjegimet çojnë te i njëjti ilaç, parashikimi me klasë reference.

*Stiven Janaqi* REDAKTOR · STIVEN CATALYST


**03** TEMA KRYESORE
**Dy vjet që u bënë tetë**

**04** SHIFRAT
**Brenda buxhetit dhe afatit**

**05** MODELI
**Pamja nga brenda dhe nga jashtë**

**06** ÇFARË THOTË KËRKIMI
**Gabim apo shtrembërim?**

**07** SI MATET
**Përballë cilës shifër?**

**08** MJETI I NUMRIT
**Karta e pamjes nga jashtë**

**09** BURIMET
**Burimet dhe metoda**


## SI LEXOHET KY NUMËR

**Shifra**
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

**Leximi ynë**
Ku flet redaktori dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

**Praktika**
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

# Dy vjet që u bënë tetë

Në vitet 1970, Daniel Kahneman-i drejtonte një ekip që shkruante një program mësimor dhe një libër për gjykimin dhe vendimmarrjen për shkollat e mesme në Izrael. Një ditë e pyeti secilin anëtar sa mendonte se do të zgjaste deri në mbarimin e librit.

Përgjigjet silleshin rreth dy vjetëve, nga një vit e gjysmë deri në dy vjet e gjysmë. Pastaj pyeti Seymour Fox-in, një ekspert programesh mësimore në ekip, si kishin ecur ekipet e tjera. Rreth 40% nuk mbaruan kurrë, tha Fox-i, dhe asnjë nga të tjerët nuk mbaroi për më pak se shtatë vjet ose për më shumë se dhjetë. Vlerësimi i tij kishte qenë brenda optimizmit të përbashkët të grupit.

---

“Jemi nën mesataren, por jo shumë.”

Ky ishte gjykimi i Fox-it për ekipin përballë të tjerëve. Ekipi vazhdoi sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Libri u mbarua tetë vjet më vonë.

LEXIMI YNË

Fox-i e kishte historinë në kokë. Ajo doli vetëm kur pyetja u kthye te ekipet e tjera.

Burimi: Daniel Kahneman, McKinsey Quarterly, 2011

Rrëfimi i vetë Kahneman-it, në një pjesë të librit Thinking, Fast and Slow që botoi McKinsey Quarterly (2011). Lovallo dhe Kahneman-i (2003) e quajnë këtë gabimi i planifikimit; për studimin me temat e diplomës që e mati, shih Nr. 44.

SHIFRAT

# Brenda buxhetit dhe afatit

Bent Flyvbjerg dhe kolegët kanë mbledhur të dhëna për koston dhe afatet e më shumë se 16.000 projekteve në mbi 20 fusha dhe 136 vende, që nga viti 1910. Te How Big Things Get Done (2023), ai dhe Dan Gardner numërojnë sa projekte i arrijnë të tria objektivat.

PROJEKTET NË BAZËN E TË DHËNAVE TË FLYVBJERG-UT, PJESA (2023)




**27%**
tejkalimi mesatar i kostos në 1.471 projekte IT (Flyvbjerg & Budzier, 2011)

**1 në 6**
ishte mjellmë e zezë: kosto mesatarisht 200% mbi plan, afati gati 70% mbi plan

LEXIMI YNË

Rreziku qëndron te bishti i shpërndarjes: te ai projekt nga gjashtë që shkon shumë përtej mesatares.

Burimet: Bent Flyvbjerg & Dan Gardner, 2023 (përmes recensioneve dhe përmbledhjeve të librit); Bent Flyvbjerg & Alexander Budzier, Harvard Business Review 89(9), 2011

Baza ka projekte të të gjitha madhësive, shumica të mëdha; është koleksion, jo mostër e rastësishme. Shifrat e librit i lexuam te recensionet e tij, jo te vetë libri.

MODELI

# Pamja nga brenda dhe nga jashtë

Dan Lovallo dhe Daniel Kahneman-i (2003) i lidhin parashikimet e këqija me pamjen nga brenda: vlerësimi ndërtohet nga detyrat dhe pengesat e vetë projektit. Pamja nga jashtë i lë mënjanë ato dhe pyet si dolën projektet e ngjashme. Flyvbjerg-u (2006) e shtjelloi në tre hapa.

**01**
**Klasa e referencës**
Projekte të shkuara, mjaft për t'u numëruar, mjaft të afërta për t'u krahasuar.

**02**
**Shpërndarja**
Si dolën vërtet kostot dhe kohët e tyre.

**03**
**Vendi**
Ku qëndron ky projekt, dhe sa duhet lëvizur vlerësimi.

LINJA 2 E TRAMVAJIT TË EDINBURGUT, PARASHIKIMI I KOSTOS NË MILIONË £




LEXIMI YNË

Një rezervë e matur me shpresë shpenzohet para se të nisë puna. Përcaktoje sipas historisë.

Burimet: Dan Lovallo & Daniel Kahneman, Harvard Business Review 81(7), 2003; Bent Flyvbjerg, Project Management Journal 37(3), 2006

Një nga përdorimet e para të metodës: 46 projekte hekurudhore të krahasueshme. 320 milionët e propozuesve kishin tashmë 25% rezervë; klasa kërkonte 40% ose 57%. Parashikim planifikimi; nuk japim rezultat.


Më shumë te eseja Ditët me volum të lartë: standardi nën presion

ÇFARË THOTË KËRKIMI

# Gabim apo shtrembërim?

Optimizmi, sipas Lovallo-s dhe Kahneman-it, është vetëmashtrim i sinqertë. Flyvbjerg-u përmend një shkak të dytë, shtrembërimin strategjik. Provat e tij erdhën nga 258 projekte transporti me vlerë 90 miliardë dollarë (2002).

TEJKALIMI MESATAR I KOSTOS SIPAS LLOJIT, 258 PROJEKTE TRANSPORTI (2002)

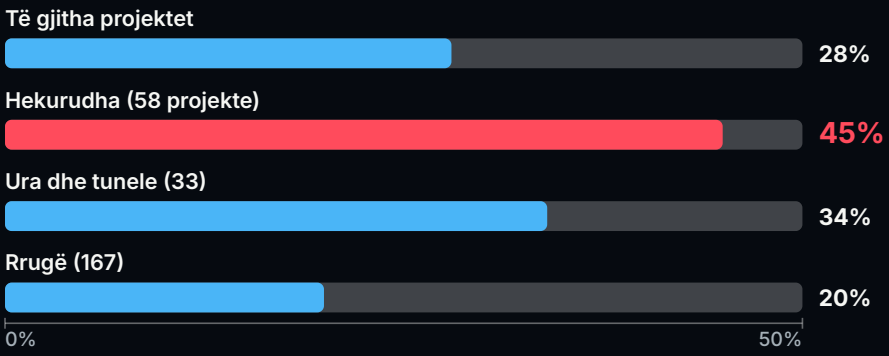


Autorët peshuan shpjegime teknike, ekonomike, psikologjike dhe politike. Nënvlerësimi, përfunduan ata, nuk shpjegohet dot me gabim dhe shpjegohet më mirë me shtrembërim strategjik, pra me gënjeshtër.

LEXIMI YNË

Të dy shkaqet kanë një ilaç: një vlerësim i kontrolluar me historinë nga dikush që nuk ka nevojë që projekti të miratohet.

Burimet: Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm & Søren Buhl, Journal of the American Planning Association 68(3), 2002; Dan Lovallo & Daniel Kahneman, Harvard Business Review 81(7), 2003

Mostra e vitit 2002 mbulon vetëm transportin, dhe një model statistikor nuk e provon qëllimin në një rast të vetëm.

SI MATET

# Përballë cilës shifër?

Një tejkalim varet nga pika e nisjes. Flyvbjerg-u dhe kolegët e gjykojnë projektin përballë vlerësimeve mbi të cilat u vendos nëse do të ndërtohej. Flyvbjerg-u dhe Gardner-i numërojnë pastaj tri objektiva njëherësh.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Kostoja** | kostoja e vërtetë përballë vlerësimit në kohën e vendimit |
| 02 | **Koha** | mbarimi i vërtetë përballë datës së premtuar në vendim |
| 03 | **Përfitimet** | çfarë jep projekti përballë asaj që premtonte arsyetimi i tij |

“Vlerësimet e kostos mbi të cilat vendoset nëse infrastruktura e rëndësishme duhet ndërtuar janë shumë dhe sistematikisht mashtruese.”

LEXIMI YNË

Një buxhet i rillogaritur në mes mund ta bëjë një projekt të vonuar dhe të shtrenjtë të duket sipas planit. Mbaji shifrat e ditës së vendimit, dhe zgjidhe masën para se të nisë projekti.

Burimet: Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm & Søren Buhl, Journal of the American Planning Association 68(3), 2002; Bent Flyvbjerg & Dan Gardner, 2023 (përmes recensioneve dhe përmbledhjeve të librit)

Citimi është nga abstrakti i Flyvbjerg-ut, Holm-it dhe Buhl-it (2002), 258 projekte transporti. Tri rreshtat janë përmbledhja jonë e këtyre pikave të nisjes; shifrat e vitit 2023 janë te faqja 4.

MJETI I NUMRIT

# Karta e pamjes nga jashtë

Plotësoje para se të miratohet vlerësimi: së pari pamja nga brenda, pastaj historia, pastaj diferenca. Më pas shëno datat e planifikuara dhe të vërtetat; Delay Analyzer mban të njëjtin lloj regjistri për itineraret.

**01 Pamja nga brenda** kostoja dhe koha jonë, të ndërtuara nga plani

**02 Klasa e referencës** projekte të ngjashme të mbaruara, tonat ose të të tjerëve, dhe sa

**03 Sa u deshi atyre** tejkalimi tipik dhe më i keqi në kosto dhe kohë

**04 Vendi ynë** pse do të dalim më mirë ose më keq, me shkrim

**05 Vlerësimi dhe rezerva** shifra për të cilën angazhohemi, dhe sa të sigurt jemi

**06 Pas mbarimit** kostoja dhe data e vërtetë, të shtuara te klasa

Burimet: Bent Flyvbjerg, Project Management Journal 37(3), 2006; Dan Lovallo & Daniel Kahneman, Harvard Business Review 81(7), 2003

Propozim i redaksisë, i ndërtuar mbi tre hapat e Flyvbjerg-ut (2006) dhe pamjen nga jashtë të Lovallo-s dhe Kahneman-it (2003). Pasi të vendoset shifra, një pre-mortem (Nr. 44) e provon planin pas saj.

**Hape mjetin: Analiza e vonesave** stivencatalyst.com/sq/tools/delay-analyzer/

BURIMET DHE METODA

# Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

**Daniel Kahneman: Beware the 'inside view' (excerpt from Thinking, Fast and Slow)**
Daniel Kahneman, McKinsey Quarterly, 2011
https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/daniel-kahneman-beware-the-inside-view

**How Big Things Get Done**
Bent Flyvbjerg & Dan Gardner, 2023 · përmes recensioneve dhe përmbledhjeve të librit

**Why Your IT Project May Be Riskier Than You Think**
Bent Flyvbjerg & Alexander Budzier, Harvard Business Review 89(9), 2011
https://hbr.org/2011/09/why-your-it-project-may-be-riskier-than-you-think

**Delusions of Success: How Optimism Undermines Executives' Decisions**
Dan Lovallo & Daniel Kahneman, Harvard Business Review 81(7), 2003
https://hbr.org/2003/07/delusions-of-success-how-optimism-undermines-executives-decisions

**From Nobel Prize to Project Management: Getting Risks Right**
Bent Flyvbjerg, Project Management Journal 37(3), 2006
https://doi.org/10.1177/875697280603700302

**Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie?**
Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm & Søren Buhl, Journal of the American Planning Association 68(3), 2002
https://ppp.worldbank.org/library/underestimating-costs-public-works-projects-error-or-lie

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat, te teksti i plotë kur u hap. Burimi i lexuar vetëm te një përmbledhje, një abstrakt ose copa shënohet me "përmes". Shifra që nuk u konfirmua te ajo që u lexua shënohet si e tillë në faqen e vet, ose lihet jashtë. Interpretimi i redaktorit shënohet "Leximi ynë".



# MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

## TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 74 · Tetor 2026 · Stiven Catalyst
Redaktuar nga Stiven Janaqi, që përgjigjet për të; "redaksia" në këtë botim është ai. Tekstet, përkthimet, faqosja dhe kontrolli i shifrave te burimet e tyre bëhen në seanca pune me Claude, një model AI i Anthropic.
stivencatalyst.com/sq/how-this-is-made.html
